


Bunntetting Nilsbukjerr. Høst 2022. Dokumentasjon utførelse.



Utlegging friksjonsmasser før membran og duk. Sand/silt/subbus 0 – 5 mm. Tykkelse minimum 50 cm. I tidligere versjon av denne dokumentasjonen, beskrives laget som ca 50 cm. Presiserer at dette betyr min 50 cm. Tidligere beskrivelse som ca. kan oppfattes dit hen at tykkelsen også kan være mindre enn 50 cm. Vi mente med det at det er min 50 cm, men varierer fra min 50 cm og stedvis betydelig høyere lagtykkelse spesielt der massene også tjener til utjevning og falloppbygging.»

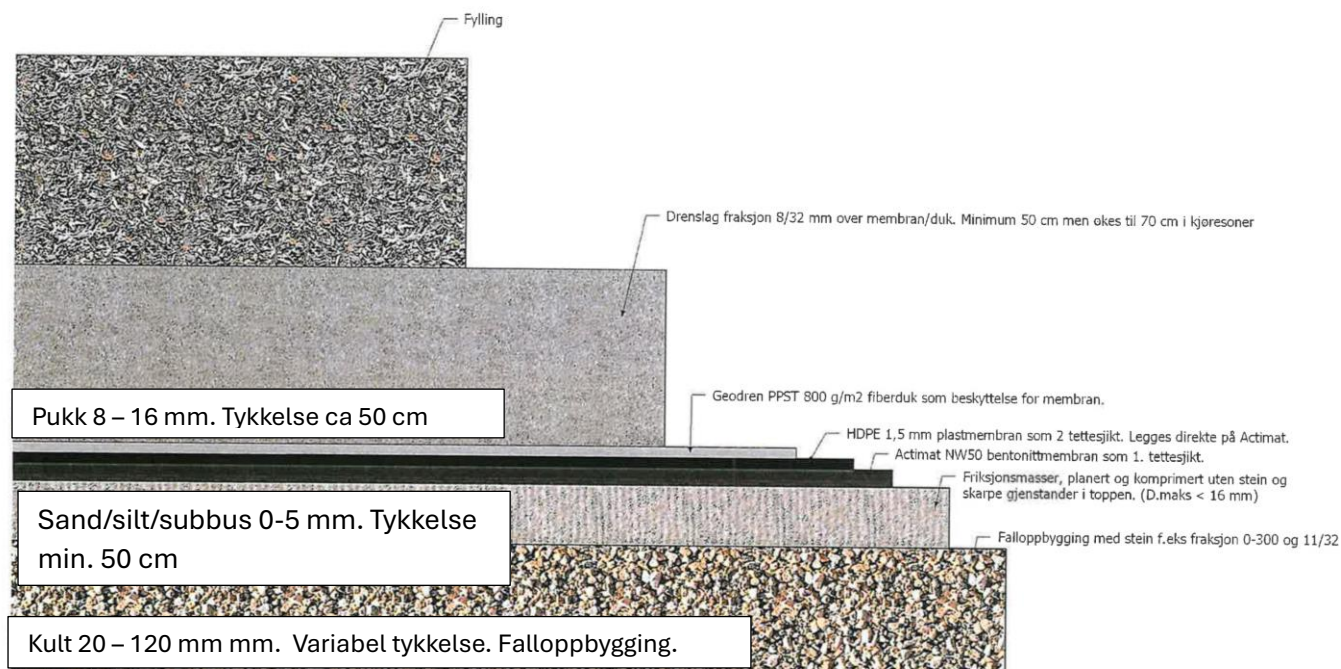

Membran, plastmembran og fiberduk lagt ut. Klargjøring for dreneringsrør og drenslag.



Bildet viser lagvis oppbygging. Pukk 8-16 mm ble lagt på fortløpende slik at øverste duk skal ligge rolig.



Bildet viser lagvis oppbygging, samt spleis inn imot forrige etappe.



Bildet viser lagvis oppbygging, samt spleis inn imot forrige etappe. Midlertidig voll mellom forrige etappe ble fjernet, og duker og membraner fra forrige etappe ble sveiset sammen.



Bildet viser lagvis oppbygging, samt spleis inn imot forrige etappe.



Bildet viser lagvis oppbygging, samt spleis inn imot forrige etappe.



Bildet viser ferdig utlagt friksjonsmasser inkludert voll i ytterkant av området.



Bildet viser dreneringsløsning. Ble koblet til allerede klargjort drenering fra forrige etappe.



Bildet viser oppfylling av drenslag med knuste pukkmasser fraksjon 8 – 16 mm.

